COMUNE DI
MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLE ZONE RURALI

– CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Elab. n° 17

ZONE INTERESSATE

- ORCOMONE
- SELVAPIANA
- CERVINO

	DATA : Aprile 2014

Il progettista
geom. Pierino Vitiello
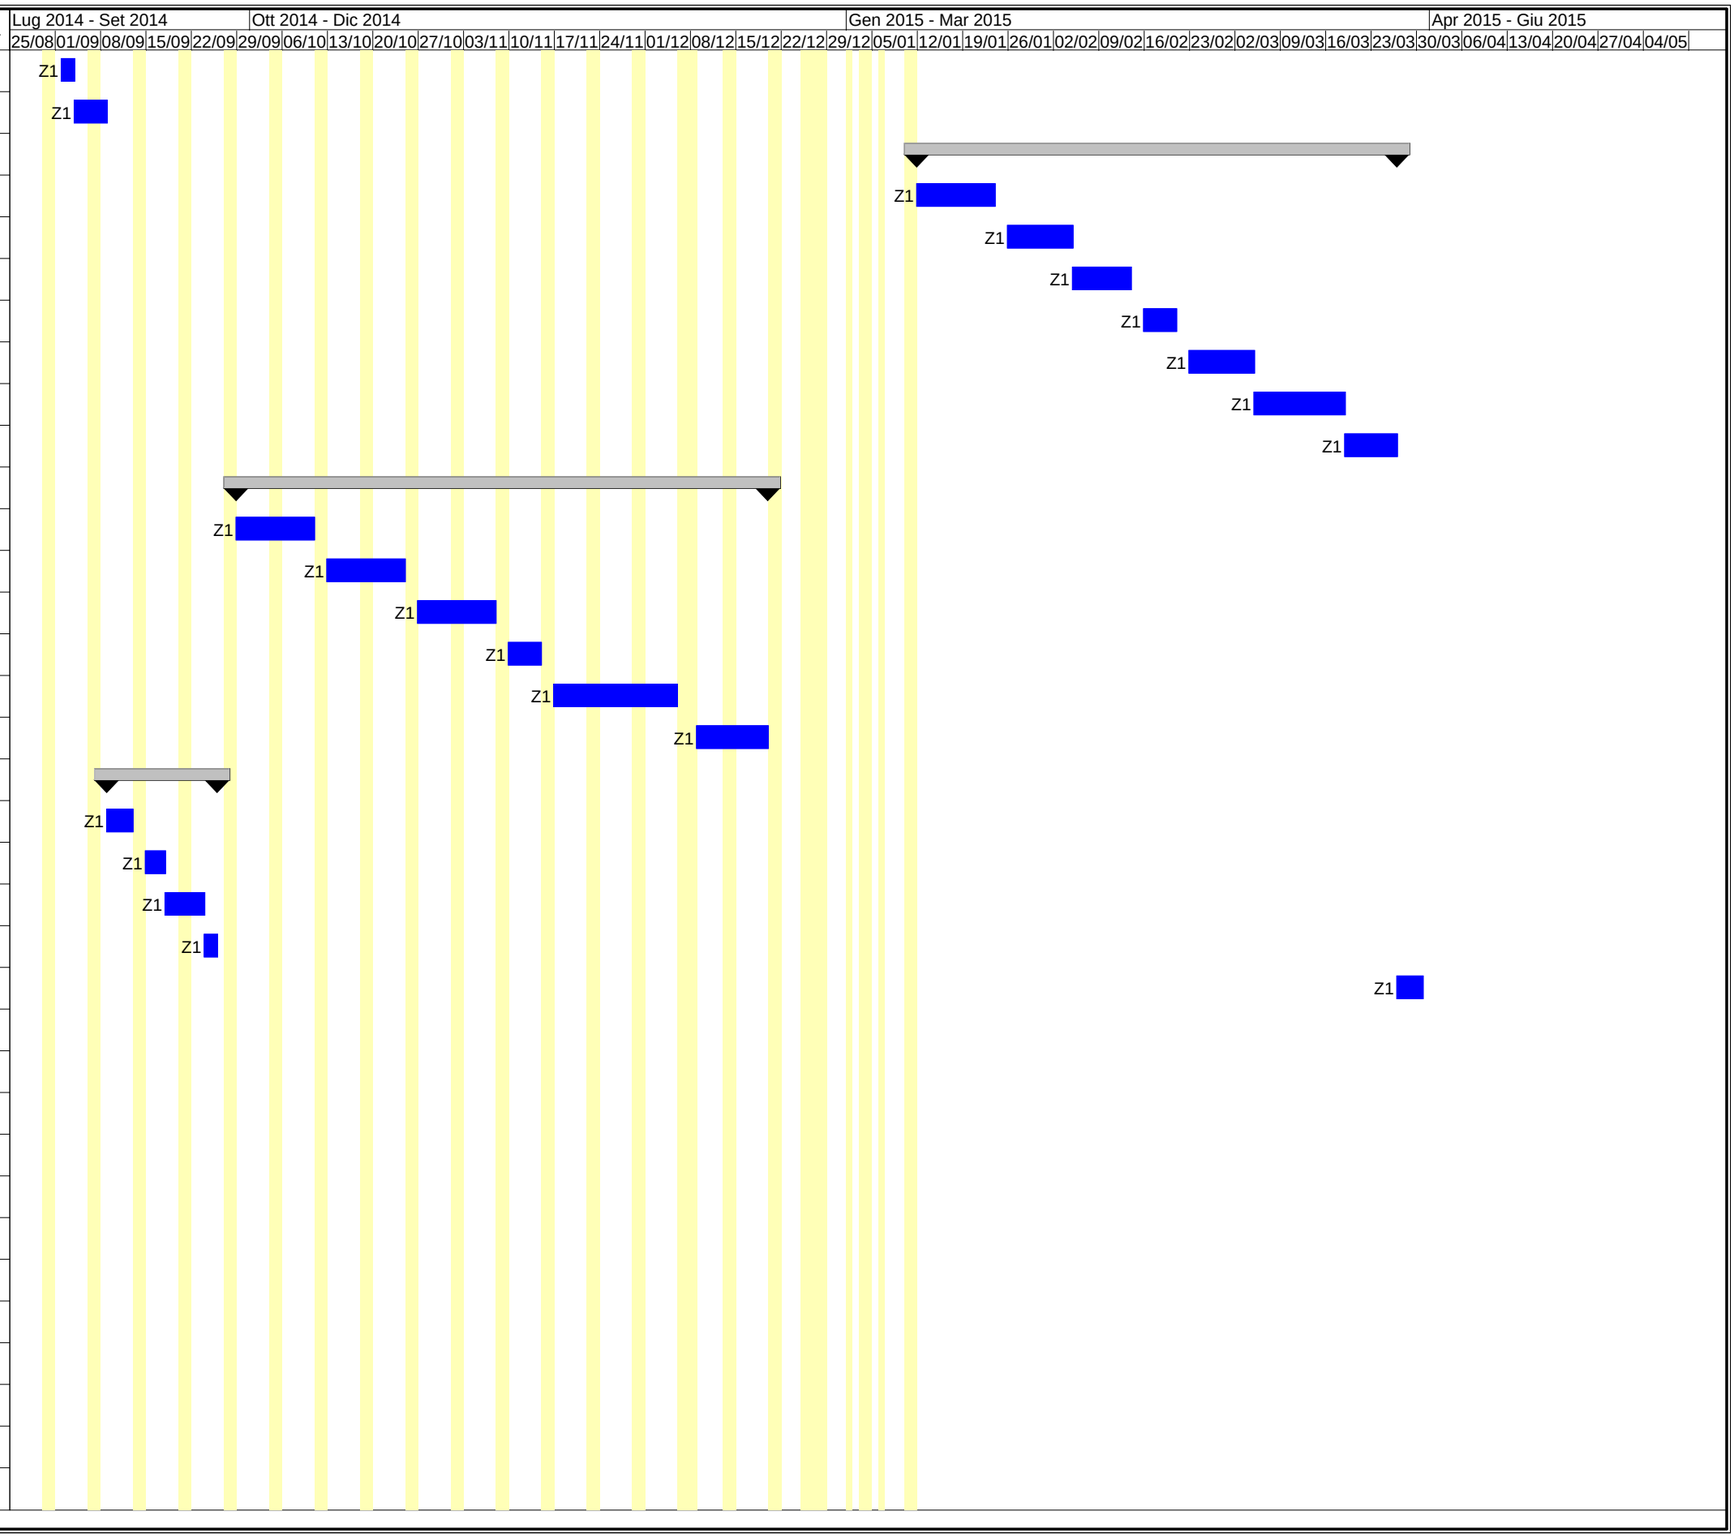
Nome attività	Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g
Manutenzione stradale	54 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	10 g
Scavo a sezione obbligata	8 g
Posa di gabbionature metalliche	7 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	5 g
Risezionamento del profilo del terreno	8 g
Formazione di fondazione stradale	10 g
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g
Pubblica illuminazione	59 g
Scavo a sezione obbligata	10 g
Posa di conduttura elettrica	10 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	10 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	15 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	9 g
Rete idrica	13 g
Scavo a sezione obbligata	4 g
Posa di conduttura idrica	3 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	4 g
Rinterro di scavo	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA
